

č. 144/15/00  
z. 21. 8. 2000 JM

**ZMLUVA O DIELO**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
/ Obchodného zákonníka/

číslo zmluvy 008/2000

**I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 OBJEDNÁVATEL :**

Štátny zdravotný ústav  
Špitálska 11  
071 01 Michalovce

zastúpený :

MUDr. Viera Nawková  
riadiateľka

Zástupca k rokovaniam

a) vo veciach zmluvných :

MUDr. Viera Nawková

b) vo veciach technických :

Miroslav Pešta – stavebný dozor

c) vo veciach finančných a ekonomických:

Ing. Jana Mihalčová

IČO :

17335680

Bankové spojenie :

NBS Humenné

Číslo účtu :

43 – 36827 552/0720

**1.2 ZHOTOVITEĽ:**

MIOS Michalovce spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
071 01 Michalovce

zastúpený :

Pavol Filko, konateľ  
Juraj Hakoš, konateľ

Zástupca k rokovaniam

a) vo veciach zmluvných :

Ing. Gabriel Hospodár

b) vo veciach technických :

Pavol Filko

Juraj Hakoš

Ing. Pavol Timko

IČO :

31 677 312

DIČ :

316 77 312/712

Bankové spojenie :

VÚB Michalovce

Číslo účtu :

786 441 552/ 0200

## II.

### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí súťažného návrhu v zmysle obstarávania prác podľa ust. zák. NR SR č. 236/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## III.

### PREDMET PLNENIA - VYKONANIE DIELA

- 3.1 Názov stavby : „ Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s využiteľným podkrovím „

Predmetom plnenia sú stavebné práce a s nimi súvisiace zhotoviteľské práce potrebné na zhotovenie rekonštrukcie strechy jestvujúceho objektu ŠZÚ Michalovce, situovaného na ul. S. Chalúpku č. 5, na parc.č. 4289 vedeného na LV č.5708 a jeho nadstavby s využiteľným podkrovím v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a špecifikácii zariadení, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť.

- 3.2 Predmetná stavba sa bude realizovať v II. častiach výstavby:

**I.časť výstavby:**

- búracie práce, zemné práce, základové konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, ostatné nenosné konštrukcie, omietky vonkajšie II., III. NP a východná fasáda I. NP včítane zateplenia, výplne otvorov v obvodových stenách, konštrukcia krovu komplet, plechová krytina, klampiarske konštrukcie okrem oplechovania parapetov I.NP, vybudovanie výťahovej šachty podľa v. č. 21, demontáž existujúceho ÚVK, ELI, ZTI v nutnom rozsahu podľa PD a ich montáž, kompletné rozvody kanalizácie, studenej pitnej vody, TÚV, resp. cirkulácie TÚV.

Súčasťou prvej časti výstavby je aj realizácia kanalizačnej prípojky k hlavnému objektu.

**II. časť výstavby:**

- vnútorné omietky stien a stropov, vonkajšie omietky včítane zateplenia I.NP úprava sokľa Marmolitom, konštrukcia podláh včítane izolácií a nášľapných vrstiev, zateplenie strešných konštrukcií, minerálne kazetové podhl'ady, keramické obklady, maľby, všetky vnútorné výplne otvorov, všetky zámočnicke výrobky, klampiarske výrobky I.NP, výťahová šachta – do dverného otvoru na prízemí osadiť drevené dvere biele včítane oceľovej zárubne, štyri dverné otvory na vyšších podlažiach zamurovať a z vonkajšej strany omietnuť, ÚVK a VZT komplet v zmysle PD, ELI – dodávka a montáž svietidiel, sušičov rúk, zásuviek a vypínačov, ZTI – dodávka a montáž zariadení predmetov.

- 3.3 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Neprevedie plnenie diela na tretie osoby bez súhlasu objednávateľa.

#### IV.

#### ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 4.1.1 Začať s realizáciou stavby v termíne do troch dní od termínu odovzdania staveniska
  - 4.1.2 Ukončiť dielo I. časti v termíne 15.12.2000
  - 4.1.3 Termín začatia a ukončenia prác II. časti bude upravený dodatkom a to dohodou zmluvných strán, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo 008/2000
  - 4.1.4 Doba realizácie kompletnej dodávky 31. 08. 2001 !
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi
- 4.2.1 projekt pre realizáciu stavby, 3 pare pri podpise zmluvy
  - 4.2.2 stavebné povolenie
  - 4.2.3 stavenisko
- 4.3 Zhotoviteľ nebude v omeškaní v prípade porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy a to o dobu trvania tohto porušenia ak
- 4.3.1 dôjde pri realizácii k podstatnej zmene oproti projektu stavby na základe ktorého bol návrh spracovaný
  - 4.3.2 alebo ak dôjde k zmene v tak krátkom termíne, že nie je možné požadovať dodržanie zmluvne stanoveného termínu o dobu primeranú k týmto skutočnostiam.

#### V.

#### CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a podľa Cenníka CENEKON pre rok 2000 tak, ako vyplýva zo súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre obstarávanie stavebných prác na zhotovenie predmetnej stavby. Cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 ZoD ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projekte stavby a súťažných podkladoch poskytnutých objednávateľom a predstavuje spolu s DPH :

Časť I. so zľavou poskytnutou zhotoviteľom..... 4.422.261,- Sk

Časť II. .... 2.861.992,- Sk

---

Cena spolu 7.284.253,- Sk

Rezerva na nepredvídateľné práce navyše 295.360.- Sk

Celková zmluvná cena 7.579.613.- Sk

---

Uvedená cena diela je maximálna v zmysle bodu 5.1.

- 5.3 Všetky zmeny, navyac práce a zámény materiálov na zabudovanie sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a projektanta písomnou formou alebo cestou stavebného denníka. Tieto zámény materiálov nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Navyac práce musia byť vopred odsúhlasené a môžu byť maximálne do výšky rozpočtovej rezervy uvedenej v bode 5.2. Ocenenie navyac vykonaných prác vykoná zhotoviteľ na základe adekvátnych položiek ponukového rozpočtu so zarátaním možných vplyvov, avšak takéto ocenenie navyac prác nesmie mať vplyv na zmluvne uzatvorenú cenu diela. Odsúhlasenie navyac prác a ich ocenenie vykoná objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa do 10 dní odo dňa doručenia cenového návrhu za navyac práce.
- 5.4 Zmena ceny diela je prípustná len v prípade celoštátne vyhlásených zmien cien MF SR (energia, devalvácia slovenskej koruny), ktoré budú publikované v právnych predpisoch.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom, dodávku technologických zariadení, mechanizmov, náklady na energiu, vodu a teplo počas zhotovovania diela potrebných k realizácii diela.

## VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na financovaní diela takto:

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom raz mesačne. Stavebný dozor objednávateľa overí súpis vykonaných a fakturovaných prác za príslušný mesiac. Takto číselne a vecne overenú a podpísanú faktúru odovzdá zástupkyni objednávateľa pre veci finančné a ekonomické k preplateniu.
- 6.2 Vyúčtovanie ceny diela, ktorej súčasťou bude súpis skutočne vykonaných prác na kompletnej dodávke diela, bude realizované v dvoch etapách samostatne pre I. a II. časť. Podkladom pre konečné vyúčtovanie ceny diela - kompletnej dodávky bude súpis skutočne vykonaných prác a odpočet jednotlivých úhrad čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ predloží do 14. dní po vykonaní diela a jeho prevzatí objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% ceny diela, pokiaľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela budú konštatované zistené vady diela. Zadržanú časť ceny diela uhradí zhotoviteľovi do 15. dní odo dňa odstránenia vady.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne za dodržania poradia položiek. Jej súčasťou je výkaz vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom objednávateľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre ukázanie druhu a rozsahu prác.
- 6.4 Splatnosť faktúr za vykonané práce je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

## VII.

### ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy má v dobe prevzatia a počas záručnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne a bezodkladne odstrániť oprávnené reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť ihneď k odstráneniu oprávnené reklamovanej vady s termínom odstránenia vady najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou doručením právnomu zástupcovi zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

## VIII.

### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje vlastné nebezpečenstvo. Od začiatku zhotovovania diela až do jeho odovzdania objednávateľovi nesie zhotoviteľ zodpovednosť za dielo.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom bez zásahu tretích osôb a s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body, odberné miesta pre napojenie el. energie a vody v rozsahu potrebnom pre realizáciu diela. Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stavajúcich sietí. Pri narušení podzemných sietí zhotoviteľom, ktoré neboli v čase realizácie vytýčené zabezpečením objednávateľa, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a PO na stavbe v zmysle súčasne platných právnych predpisov.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Objednávateľ určí skládku odpadu a sute a tiež manipulačnú plochu a vonkajšiu skládku na materiál.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto náklady bude znášať zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 8.10.

- 8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník v zmysle platných predpisov. Na riadenie prác zhotoviteľ určuje vedúceho stavby, ktorého meno bude uvedené v stavebnom denníku a je spôsobilý na výkon tejto činnosti podľa osobitného predpisu .
- 8.9 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor a poveruje ním pracovníka, ktorého meno bude uvedené v stavebnom denníku. Funkciu stavebného dozoru a stavbyvedúceho budú vykonávať osoby odborne spôsobilé podľa zákona č. 136/1995 Z.z v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov.
- 8.10 Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok - revízné správy, tlakové skúšky tesnosti, funkčné skúšky a ostatné skúšky v súlade s platnými a záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi termín ukončenia diela.
- 8.13 Objednávateľ dielo prevezme naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Ak práce nedosiahnú kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, stavbu neprevezme. Ak vzniknú okolnosti pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke / užívaniu /, dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 8.14 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom budú uvedené okrem iného záväzky prijaté pri tomto konaní.
- 8.15 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví následovné doklady :
- jedno kompletné pare projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
  - stavebné denníky
  - osvedčenie o akosti materiálov
  - doklady v zmysle bodu 8.10 a 8.11
- 8.16 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

## IX.

### ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku III. zmluvy po termíne uvedenom v bode 4.1 z dôvodov na strane zhotoviteľa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nevyfakturovanej čiastky za každý deň omeškania, až do ukončenia celej stavby podľa zmluvných podmienok.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 7.2 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.
- 9.3 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania a zabezpečí odstránenie väd a nedorobkov v dohodnutom termíne podľa bodu 8.14.
- 9.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný

zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

9.5 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

## X.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na operatívnych poradách 1x týždenne a kontrolných dňoch poriadaných 1x mesačne.
- 10.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3 Ak sa plnenie predmetu tejto zmluvy stane nemožným z dôvodov na strane objednávateľa, požiada zhotoviteľ objednávateľa o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
- 10.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ skutočné náklady.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu z dôvodov nezaplatenia faktúr po uplynutí troch mesiacov omeškania platieb.

## XI.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú chronologicky číslované a budú súčasťou zmluvy číslo 008/2000.
- 11.3 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda oboch zmluvných strán.
- 11.4 Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ, dve zhotoviteľ a jedno vyhotovenie bude zaslané MZ SR.
- 11.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali a porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že nebola uzavretá v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú nižšie uvedené podpisy.

V Michalovciach 21.8.2000

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ  
ÚSTAV  
071 01 MICHALOVCE  
- 23 -

MIOS MICHALOVCE, spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
MICHALOVCE  
1

č. 144/15/00  
z 18.9.2000 JTK

**Dodatok č.1**  
**K zmluve o dielo č. 008/2000**

**1./ Objednávateľ:**

Štátny zdravotný ústav  
Špitálska 11  
071 01 Michalovce

**Zastúpený:**

MUDr. Viera Nawková  
riaditeľka

**Zástupca k rokovaníu**

a/ vo veciach zmluvných:

MUDr. Viera Nawková

b/ vo veciach technických

Miroslav Pešta – stavebný dozor

c/ vo veciach finančných a ekonomických:

Ing. Jana Mihalčová

**IČO:**

17335680

**Bankové spojenie:**

NBS Humenné

**Číslo účtu:**

43 – 36827552/0720

**2./ Zhotoviteľ:**

MIOS Michalovce, spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
071 01 Michalovce

**Zastúpený:**

Pavol Fil'ko, konateľ  
Juraj Hakoš, konateľ

**Zástupca k rokovaníu**

a/ vo veciach zmluvných:

Ing. Gabriel Hospodár

b/ vo veciach technických:

Pavol Fil'ko

Juraj Hakoš

Ing. Pavol Timko

**IČO:**

31677312

**DIČ:**

31677312/712

**Bankové spojenie:**

VÚB Michalovce

**Číslo účtu:**

786441552/0200

sa dohodli na dodatku č.1 v tomto znení:

**I.**

Harmonogram prác na stavbe „ Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s využitelným podkrovím“ I. časť

- |  |               |
|--|---------------|
| 1./ Demontáž UK, ZTI, ELI, VZT                   | do 30.8.2000  |
| 2./ Búracie práce                                | do 27.9.2000  |
| 3./ Zemné práce                                  | do 5.10.2000  |
| 4./ Základové konštrukcie                        | do 10.10.2000 |
| 5./ Zvislé konštrukcie /nosné/                   | do 15.10.2000 |
| 6./ Vodovodné konštrukcie /želez.doska INP/      | do 20.10.2000 |
| 7./Ostatné nenosné konštrukcie priečky priebežne | od 15.10.2000 |



8./ Železobetónová doska II.NP	do 10.11.2000
9./ Železobetónová doska III.NP	do 24.11.2000
10./ Strecha komplet	do 15.12.2000
11./ Výplne otvorov priebežne	od 20.10.2000
12./ Výtáhová šachta priebežne	od 11.10.2000
13./ Omietky vonkajšie I.II.III.,NP	od 22.10.2000
14./ Ostatné práce	do 15.12.2000

## II.

- 1./Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.
- 2./Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 3./Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 4./Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.008/2000.

V Michalovciach dňa 18.9.2000

Objednávateľ:

*Kováč*  
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ  
ÚSTAV  
071 01 MICHALOVCE  
- 23 -

Zhotoviteľ:

MIOS MICHALOVCE, spol. s r.o.  
Príemyselná 14  
MICHALOVCE  
2

*[Handwritten signature]*

č. 144/15/00  
z 13.2.2001 JH

**DODATOK č. 2**  
**k zmluve o dielo č. 008/2000 zo dňa 21.8.2000**

**1. Objednávateľ :**

**Štátny zdravotný ústav**  
**Špitálska 11**  
**071 01 Michalovce**

Zastúpený :

MUDr. Viera Nawková  
riaditeľka

Zástupca k rokovaniam :

a/ vo veciach zmluvných :

b/ vo veciach technických :

c/ vo veciach finančných a ekonomických :

MUDr. Viera Nawková  
Miroslav Pešta - stavebný dozor  
Ing. Jana Mihalčová

IČO :

17335680

Bankové spojenie :

NBS Humenné

Číslo účtu :

43-36827552/0720

**2. Zhotoviteľ :**

**MIOS Michalovce, spol.s.r.o.**  
**Priemyselná 14**  
**071 01 Michalovce**

Zastúpený :

Pavol Fil'ko, konateľ  
Juraj Hakoš, konateľ

Zástupca k rokovaniam :

a/ vo veciach zmluvných :

b/ vo veciach technických :

Ing. Gabriel Hospodár  
Pavol Fil'ko  
Juraj Hakoš  
Ing. Pavol Timko

IČO :

31677312

DIČ :

31677312/712

Bankové spojenie :

VÚB Michalovce

Číslo účtu :

786441552/0200,

sa dohodli na dodatku č. 2 v tomto znení :

**I.**

Termín začatia prác na stavbe „Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s využiteľným podkrovím“ II. časť je 12. február 2001.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 008/2000 zo dňa 21.8.2000 sa týmto dodatkom nemenia.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.008/2000 zo dňa 21.8.2000 a Harmonogram výstavby „Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s využiteľným podkrovím“ - II. časť zo dňa 9. 2. 2001 tvorí Prílohu č.1 tohoto dodatku.


V Michalovciach dňa: 13. 2. 2001

MIOS MICHALOVCE, spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
MICHALOVCE  
1

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

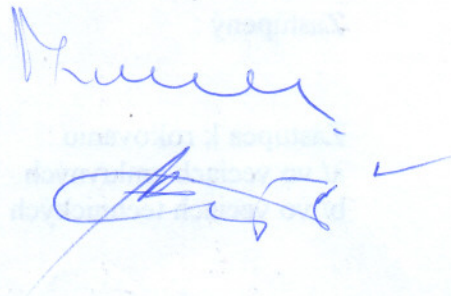

STÁTNY ZDRAVOTNÝ  
ÚSTAV  
071 01 MICHALOVCE  
- 22 -

E. 144/15/00  
z. 20.6. 2001

# Dodatok č.3

k zmluve o dielo č.008/2000 zo dňa 21.8.2000

1. Objednávateľ :
- Štátny zdravotný ústav  
Špitálska 11  
071 01 Michalovce
- Zastúpený : MUDr. Viera Nawková  
riaditeľka
- Zástupca k rokovaniam :
- a) vo veciach zmluvných MUDr. Viera Nawková  
b) vo veciach technických Miroslav Pešta – stavebný dozor  
c) vo veciach finančných a ekonomických Ing. Jana Mihalčová
- IČO : 173 356 80  
Bankové spojenie : NBS Humenné  
Číslo účtu : 43-3682 7552/0720
2. Zhotoviteľ :
- MIOS Michalovce spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
071 01 Michalovce
- Zastúpený : Pavol Fil'ko, konateľ  
Juraj Hakoš, konateľ
- Zástupca k rokovaniam :
- a) vo veciach zmluvných : Ing. Gabriel Hospodár  
b) vo veciach technických : Pavol Fil'ko  
Juraj Hakoš  
Ing. Pavol Timko
- IČO : 316 773 12  
DIČ : 316 773 12/712  
Bankové spojenie : VÚB Michalovce  
Číslo účtu : 786441552/0200

sa dohodli na dodatku č.3 v tomto znení :

## I.

Zmluva o dielo č.008/2000 zo dňa 21.8.2000 v bode

## III.

### Predmet plnenia – vykonanie diela

bod 3.2. ods."II.časť výstavby" sa dopĺňa o odstavec tohoto znenia :

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli s doplnením stavby o žiadané práce navyše, a to o zabezpečovacie zariadenie, telefónnu ústredňu s koncovými zariadeniami, štrukturovaný kabeľný systém pre počítačové siete a telefónnu sieť, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

## V.

### Cena diela

bod.5.2. – Celková zmluvná cena sa nahrádza sumou 7 993 tis.Sk.

dopĺňa sa o bod 5.6. v znení:

Zhotoviteľ bude zmluvy o dielo so subdodávateľmi na predmet Dodatku č.3 konzultovať pred podpísaním s objednávateľom.

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.008/2000 zo dňa 21.8.2000 sa týmto dodatkom nemenia.
2. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami.
3. Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.008/2000 zo dňa 21.8.2000

V Michalovciach 20.6.2001


Objednávateľ :



**Štátny zdravotný ústav  
MICHALOVCE**

20

Zhotoviteľ :



**MIOS MICHALOVCE, spol. s r.o.  
Priemyselná 14  
MICHALOVCE**
